Hus 2

2023-- Brf Kungen Bottenavlopp

Upprättad: 2023-12-15
Upprättad av: Patrik
Reviderad:
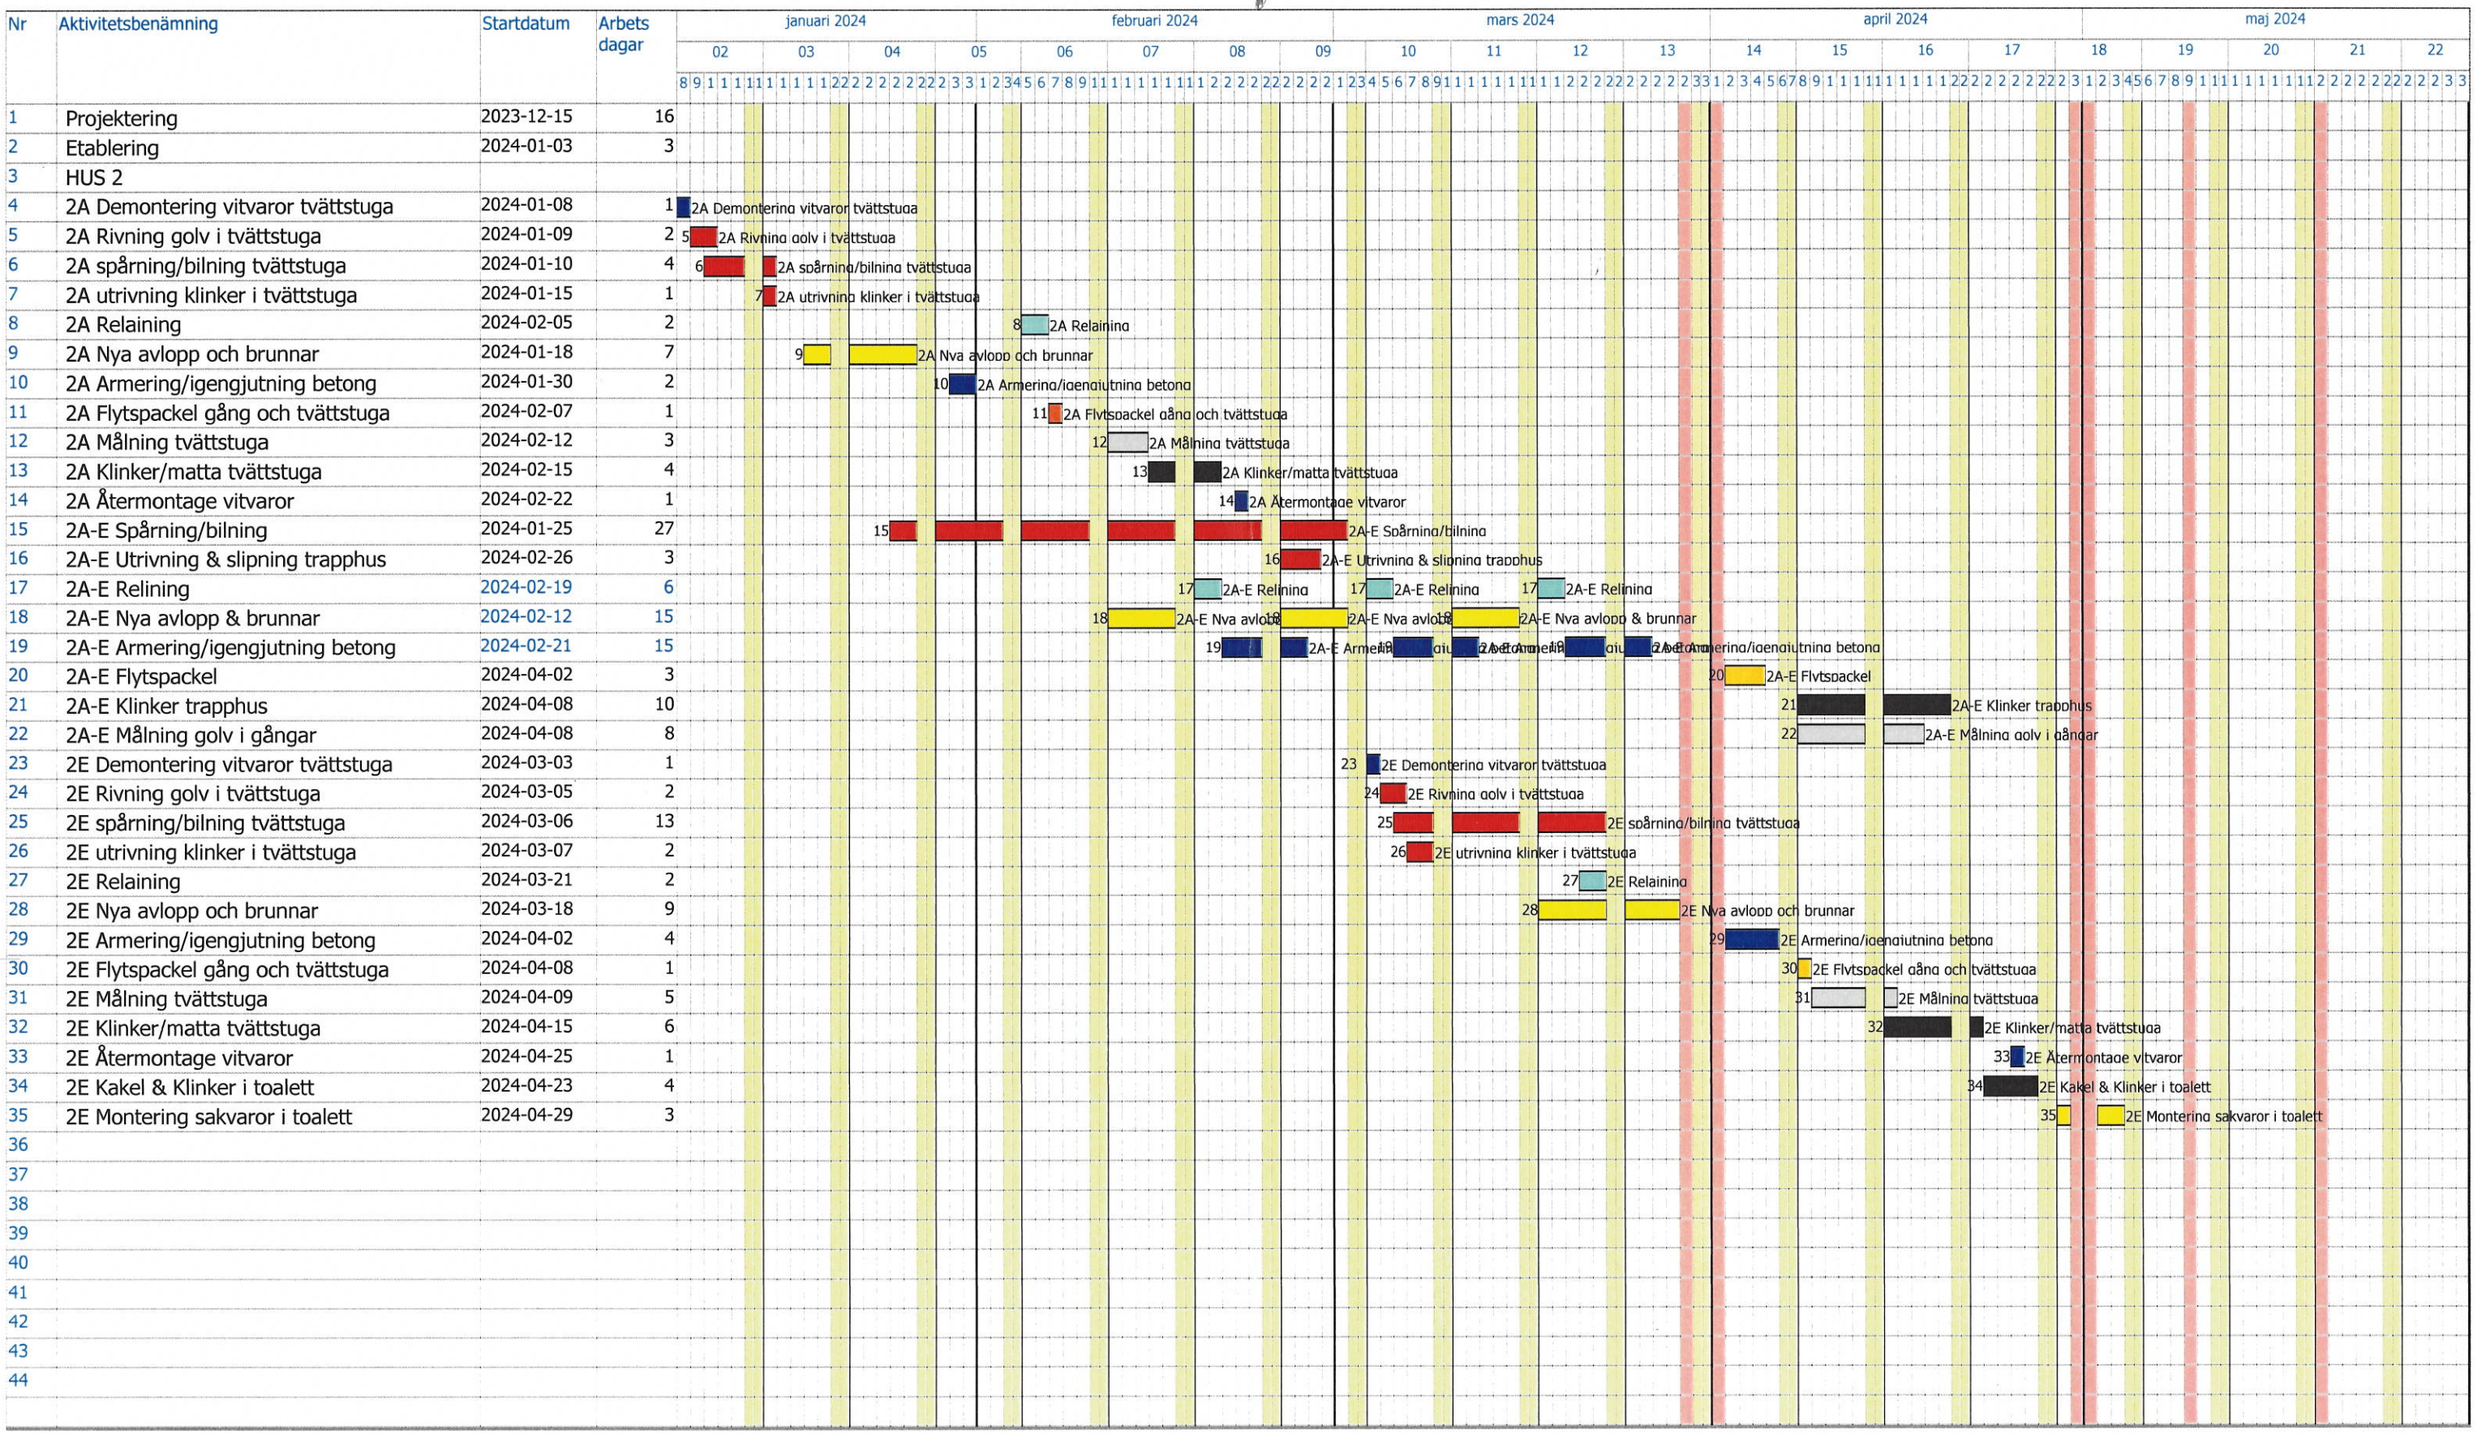
Nr	Aktivitetsbenämning	Startdatum	Arbets dagar
1	Projektering	2023-12-15	16
2	Etablering	2024-01-03	3
3	HUS 2		
4	2A Demontering vitvaror tvättstuga	2024-01-08	1
5	2A Rivning golv i tvättstuga	2024-01-09	2
6	2A spårning/bilning tvättstuga	2024-01-10	4
7	2A utrivning klinker i tvättstuga	2024-01-15	1
8	2A Relaining	2024-02-05	2
9	2A Nya avlopp och brunnar	2024-01-18	7
10	2A Armering/igengjutning betong	2024-01-30	2
11	2A Flytspackel gång och tvättstuga	2024-02-07	1
12	2A Målning tvättstuga	2024-02-12	3
13	2A Klinker/matta tvättstuga	2024-02-15	4
14	2A Återmontage vitvaror	2024-02-22	1
15	2A-E Spårning/bilning	2024-01-25	27
16	2A-E Utrivning & slipning trapphus	2024-02-26	3
17	2A-E Relining	2024-02-19	6
18	2A-E Nya avlopp & brunnar	2024-02-12	15
19	2A-E Armering/igengjutning betong	2024-02-21	15
20	2A-E Flytspackel	2024-04-02	3
21	2A-E Klinker trapphus	2024-04-08	10
22	2A-E Målning golv i gångar	2024-04-08	8
23	2E Demontering vitvaror tvättstuga	2024-03-03	1
24	2E Rivning golv i tvättstuga	2024-03-05	2
25	2E spårning/bilning tvättstuga	2024-03-06	13
26	2E utrivning klinker i tvättstuga	2024-03-07	2
27	2E Relaining	2024-03-21	2
28	2E Nya avlopp och brunnar	2024-03-18	9
29	2E Armering/igengjutning betong	2024-04-02	4
30	2E Flytspackel gång och tvättstuga	2024-04-08	1
31	2E Målning tvättstuga	2024-04-09	5
32	2E Klinker/matta tvättstuga	2024-04-15	6
33	2E Återmontage vitvaror	2024-04-25	1
34	2E Kakel & Klinker i toalett	2024-04-23	4
35	2E Montering sakvaror i toalett	2024-04-29	3
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44
